


◆汚泥再生処理センター海津木苑建設工事「航空写真」及び「進捗率」
『令和4年11月1日～12月15日』

〈2022年11月1日〉

北東


真上

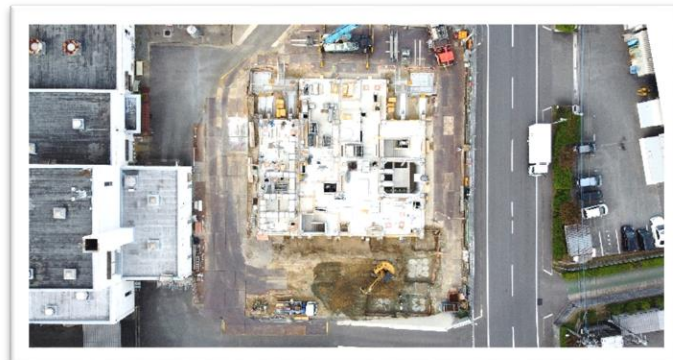

〈2022年11月15日〉

南東

真上

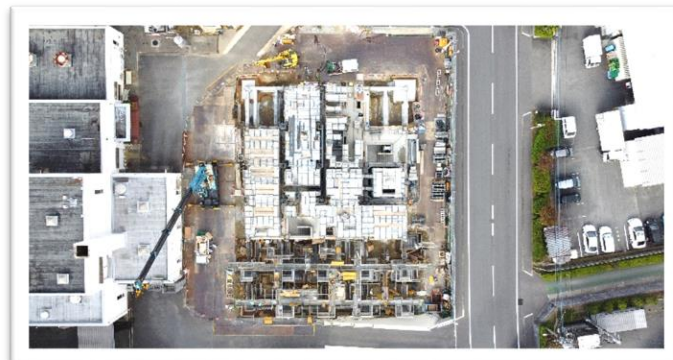

〈2022年12月5日〉

南東


真上



〈2022年12月15日〉

南西

真上

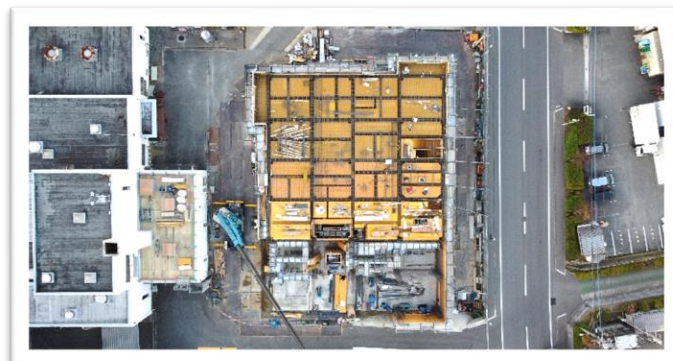

◆進捗率『令和4年11月末現在』：予定 36.0% 実績 34.7%
